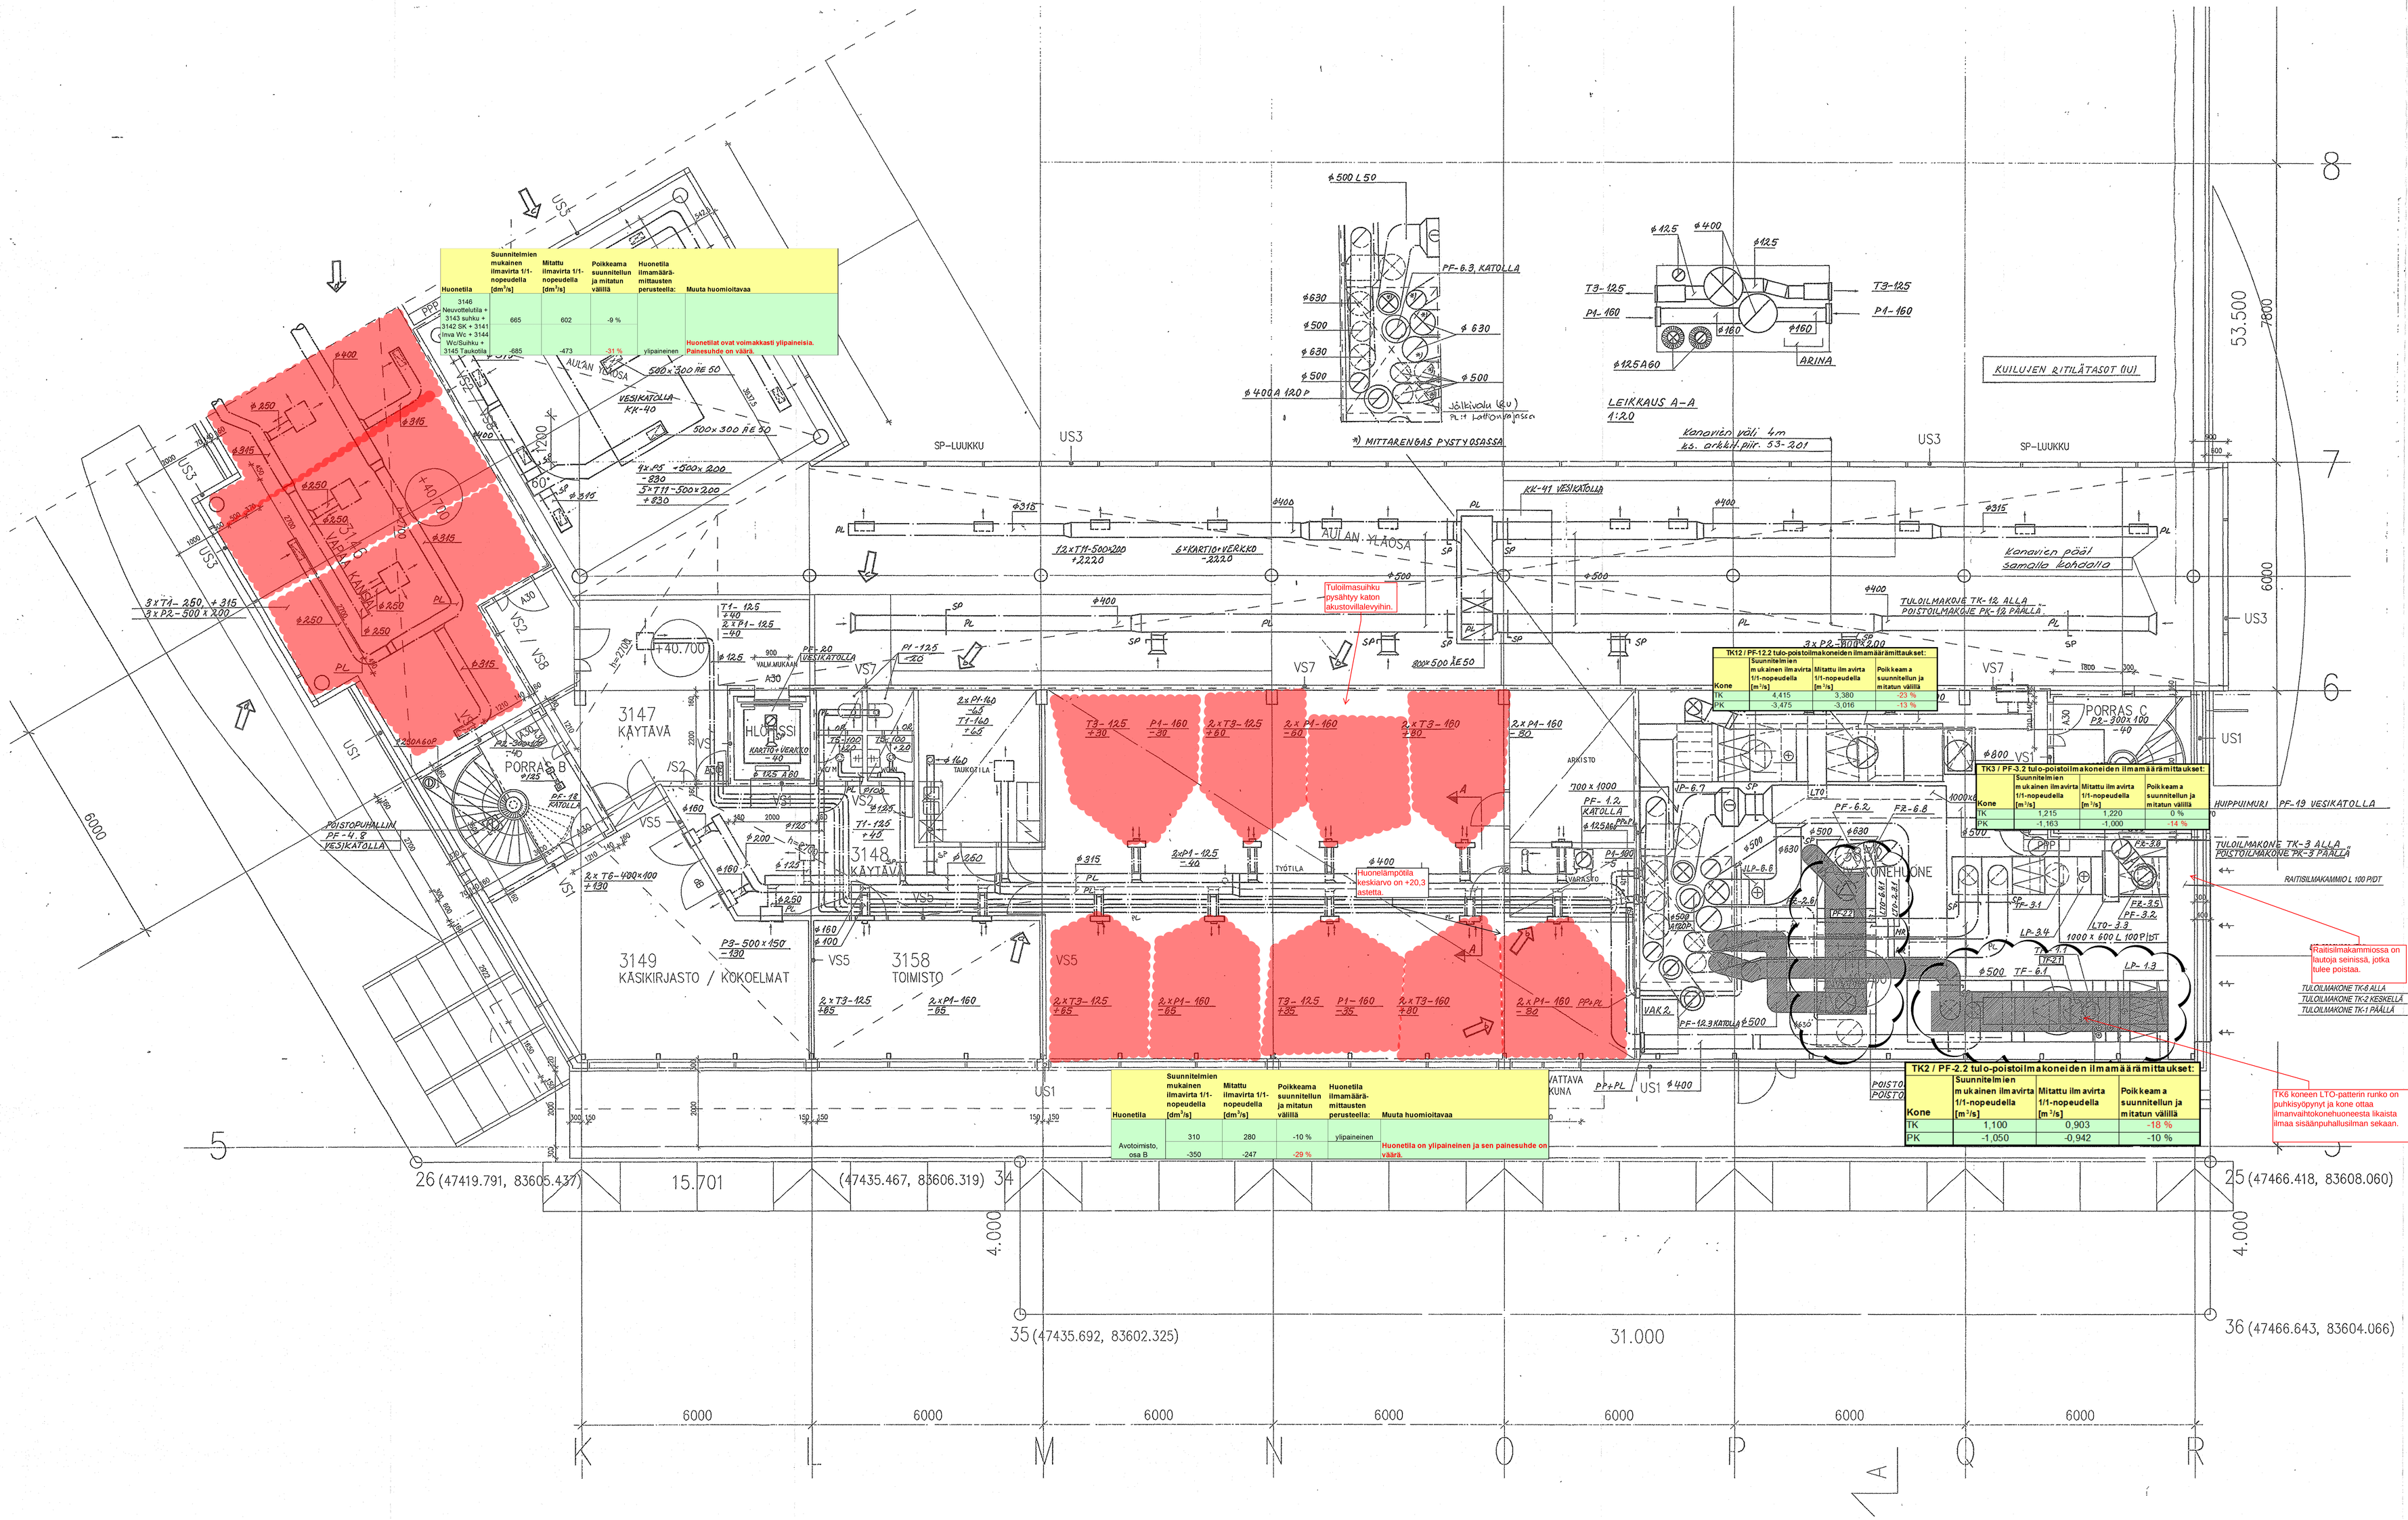

Huonetila	Suunnitelmien mukainen ilmavirta 1/1-nopeudella [dm³/s]	Mitattu ilmavirta 1/1-nopeudella [dm³/s]	Poikkeama suunnitellun ja mitatun välillä	Huonetila ilmamäärä-mittausten perusteella:	Muuta huomioitavaa
3146 Neuvottelutila + 3143 suihku + 3142 SK + 3141 Ilma Wc + 3144 WcSuihku + 3145 Taukotila	665	602	-9 %		
	-665	-473	-31 %	ylipaineinen	Huonetilat ovat voimakkasti ylipaineisia. Painesuhde on väärä

Huonetila	Suunnitelmien mukainen ilmavirta 1/1-nopeudella [dm³/s]	Mitattu ilmavirta 1/1-nopeudella [dm³/s]	Poikkeama suunnitellun ja mitatun välillä	Huonetila ilmamäärä-mittausten perusteella:	Muuta huomioitavaa
Avotoimisto, osa B	310	280	-10 %	ylipaineinen	Huonetila on ylipaineinen ja sen painesuhde on väärä.
	-350	-247	-29 %		

TK12 / PF-12.2 tulo-poistoilmakoneiden ilmamäärämittaukset:

Kone	Suunnitelmien mukainen ilmavirta 1/1-nopeudella [m³/s]	Mitattu ilmavirta 1/1-nopeudella [m³/s]	Poikkeama suunnitellun ja mitatun välillä
TK	4,415	3,380	-23 %
PK	-3,475	-3,016	-13 %

TK3 / PF-3.2 tulo-poistoilmakoneiden ilmamäärämittaukset:

Kone	Suunnitelmien mukainen ilmavirta 1/1-nopeudella [m³/s]	Mitattu ilmavirta 1/1-nopeudella [m³/s]	Poikkeama suunnitellun ja mitatun välillä
TK	1,215	1,220	0 %
PK	-1,163	-1,000	-14 %

TK2 / PF-2.2 tulo-poistoilmakoneiden ilmamäärämittaukset:

Kone	Suunnitelmien mukainen ilmavirta 1/1-nopeudella [m³/s]	Mitattu ilmavirta 1/1-nopeudella [m³/s]	Poikkeama suunnitellun ja mitatun välillä
TK	1,100	0,903	-18 %
PK	-1,050	-0,942	-10 %

TUNNUS

JAKFLU
POISTOJATKA
PALOVAROITIN
SAVUNPOISTO
RAKENNUS-LOKERO
LAITAMO
VANTAAN KAUPUNKI
VAIKK

PIIRUSTUSMERKINTÖJEN SELITYKSET:

= ILMAN LIIKE MERKKISAVUMITTAUKSESSA

= MUUTA HUOMIOITAVAA

= SUOJAAMATTOMIA MINERAALIVILLAERISTEITÄ KANAVISSA / KAMMIOISSA

Huonelämpötila keskiarvo on +20,3 astetta.

= HUONELÄMPÖTILAN KESKIARVO 5.10.-5.12.2012 SEURANTAJAKSOLLA

TK-2 ja PK-2 ilmamäärät nosteteon mukaisilla
130dm³/s (-970dm³/s --> +-1100dm³/s) ja
(-920dm³/s --> -1050dm³/s)
Lämmityspiirin (TK-2) virtaama:
LVS32: 1152 l/h --> 1317 l/h

TILAUS: 4 15 056/3/ 064

MYYRMÄKITALO/HENKILÖSTÖTILAT/LUKUSALI

Kiinteistötunnus	Kortteli/Tila	Tontti/Rno	Viraomaisen eräpäivämerkintä varten
15	15404	1	

Rakennuksen käyttötarkoitus: MUUTOS
Rakennuksen osa ja osoite: MYYRMÄKITALO/HENKILÖSTÖTILAT/LUKUSALI KILTERINRAITTI 6 01600 VANTAA
Piirustuksen nimi: ILMANVAIHTOLAITTEET
Piirustuksen osa: OSA B, KERROKSET 3 KERROSTA
Mittakaava: 1:50
Suunnittelulle: Työn n:o / Piir.n:o / Muutos
VANTAAN KAUPUNKI TILAKESKUS , Hankepalvelut

LIITE 8: TUTKIMUS- JA VAURIOKARTTA 3.KERROS B-OSA

Kiinteistötunnus	Kortteli/Tila	Tontti/Rno	Viraomaisen eräpäivämerkintä varten
15	15404	1	

Rakennuksen käyttötarkoitus	Piirustuksen sisältö	Mittakaava
UUDISRAKENNUS	ILMANVAIHTO	
MYYRMÄEN VAPAA-AJANTALO KILTERINRAITTI 6 01600 VANTAA	3.KERROS, OSA B	1:50
RAKENNUS-KONSULTIT Tekniikantie 4 Otaniemi PL 27 00151 Helsinki Puh. (09) 49011 Fax (09) 4601311	Arkisto-n: 1A607 L	Mittaf
Piir. LLH Suun. EHR Tark./Hyv. JAL Päiv. 8.01.1992	Suunnitelmat: LVI L431-011	Perust.

Kiinteistötunnus	Kortteli/Tila	Tontti/Rno	Viraomaisen eräpäivämerkintä varten
15	15404	1	

Rakennuksen käyttötarkoitus	Piirustuksen sisältö	Arkisto-tn
UUDISRAKENNUS	TYÖPIIRUSTUS	
MYYRMÄEN VAPAA-AJANTALO KIL TERINRAITTI 6 01600 VANTAA	3.KERROS, 3 KERROS, OSA B	1:50
Ac Rakennetekniikka Innova-Teh Puutarhatie 3 00189 Espoo Puh. 90 4500200 Fax 90 4500288	Suun. m.a. ARK	Piir. no 651 Pvä no 03.-11 03.-03.12.92 Muutos
Päiväys 13.01.1992	Tark./Hyv. H. RANTALA-STEWART	Piirustus nro
